

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 06 luglio 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 6 luglio 2022 dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL – studio Rustico), ing. Andrea Lombardo (General Contractor Engie Servizi S.p.A), geom. Ferdinand Platter (impresa Recover), ing. Mulas (Studio Rollino), amministratore avv. Filippo Meucci

Si verbalizza quanto segue:

1. È stato aperto il passaggio lato nord civico 35 per la condomina temporaneamente invalidata. Il passaggio rimane aperto ad esclusione dei tempi in cui gli operai devono effettuare lavorazioni sul ponteggio in corrispondenza del passaggio. In tal caso si invita la condomina ad accordarsi con il capocantiere o con gli operai presenti in modo da far aprire il passaggio.



2. In cantiere è presente il nuovo campione di colore facciata, effettuato con il tintometro. L'amministratore ha inviato ai condomini la circolare per la raccolta firme, che terminerà il 12 luglio



CORPI ILLUMINANTI PLAFONE PILOTIS: L'amministratore chiede a Engie di verificare se la sostituzione rientra nel massimale

CIVICO 33:


3. Terminata la posa pannelli isolanti su plafone

CIVICO 35:

4. In rif. al verbale del 29/06/2022 si specifica che le unità esterne dei condizionatori verranno rimosse prima di effettuare le lavorazioni, fermo restando l'intenzione di smontarli il più tardi possibile, compatibilmente con le

lavorazioni da effettuare in modo da non disattivare i condizionatori nel periodo caldo.

5. In area di cantiere lato nord è presente un nuovo box da adibirsi a spogliatoio per gli operai

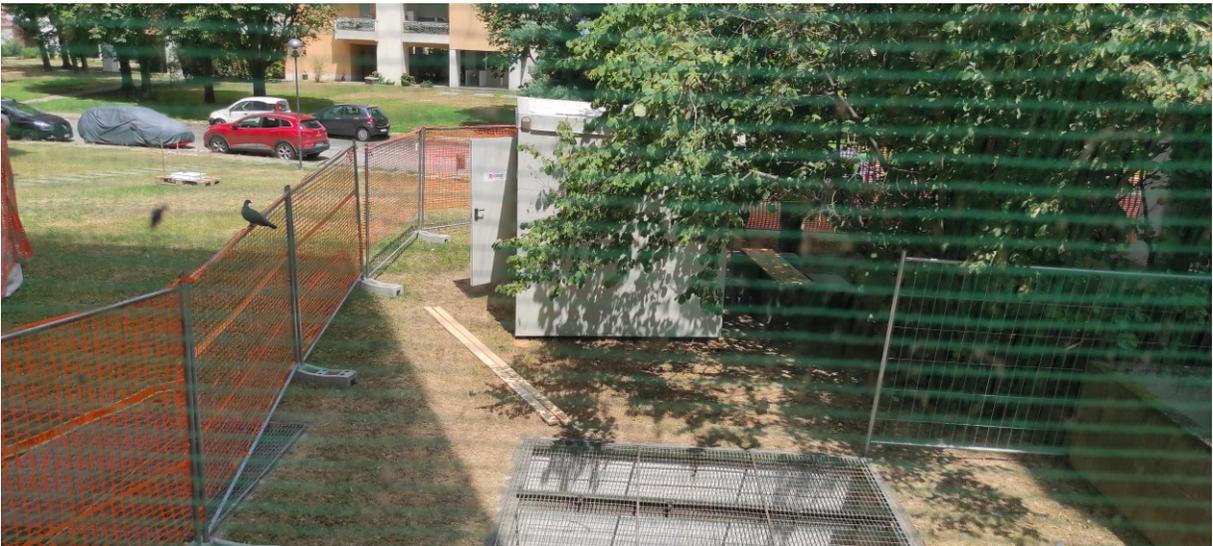

6. La sig.ra Negri 7° piano lato est provvederà a liberare il balcone da lunedì prossimo
7. È stata effettuata la tassellatura lato est e ovest




8. Posati i pannelli su tutto lato est e i primi quattro piani del lato ovest, compresi i tasselli
9. Effettuata la rasatura imbotti lato sud e lato est i primi 4 piani



10. Si chiede all'impresa di ripulire il ponteggio dalle macerie presenti

11. In cantiere sono stoccati i pannelli di XPS spessore 2 cm per i balconi



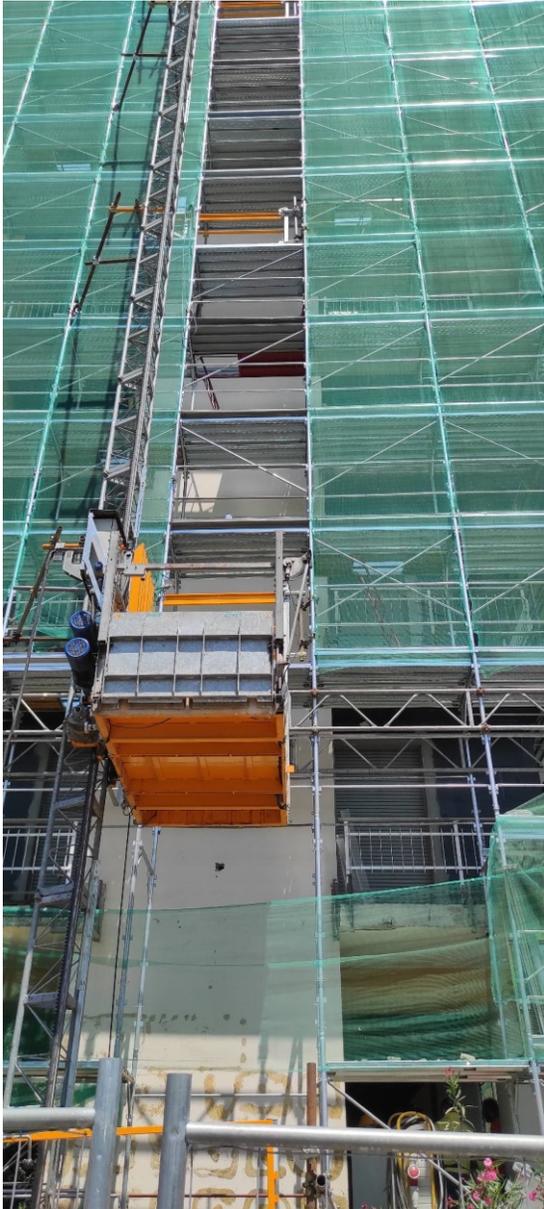

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

