

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 26 luglio 2022

VERBALE DI CANTIERE


Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 26 luglio 2022 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: ing. Rustico e collaboratrice arch. Elisabetta Baroni, ing. Andrea Lombardo (General Contractor Engie Servizi S.p.A), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), ing. Mulas (Studio Rollino)

Si verbalizza quanto segue:


1. Vengono effettuate le prove di estrazione dei tasselli per verificare se la lunghezza di 23 cm del tassello è idonea all'utilizzo per fissaggio dei pannelli isolanti in presenza di camera d'aria nella muratura perimetrale dell'immobile

Si effettuano n. 2 prove di estrazione su lato ovest secondo piano. Le prove non forniscono risultati in quanto si constata che lo strumento utilizzato per misurare la resistenza del tassello ha una taratura sovra dimensionata (1 KN). Vengono effettuati altri due tentativi di estrazione ma lo strumento non riesce ad agganciare correttamente l'estremità del tassello e, di conseguenza, non è possibile l'estrazione. La prova di estrazione viene riprogrammata a data da stabilirsi e con strumento di idonea taratura

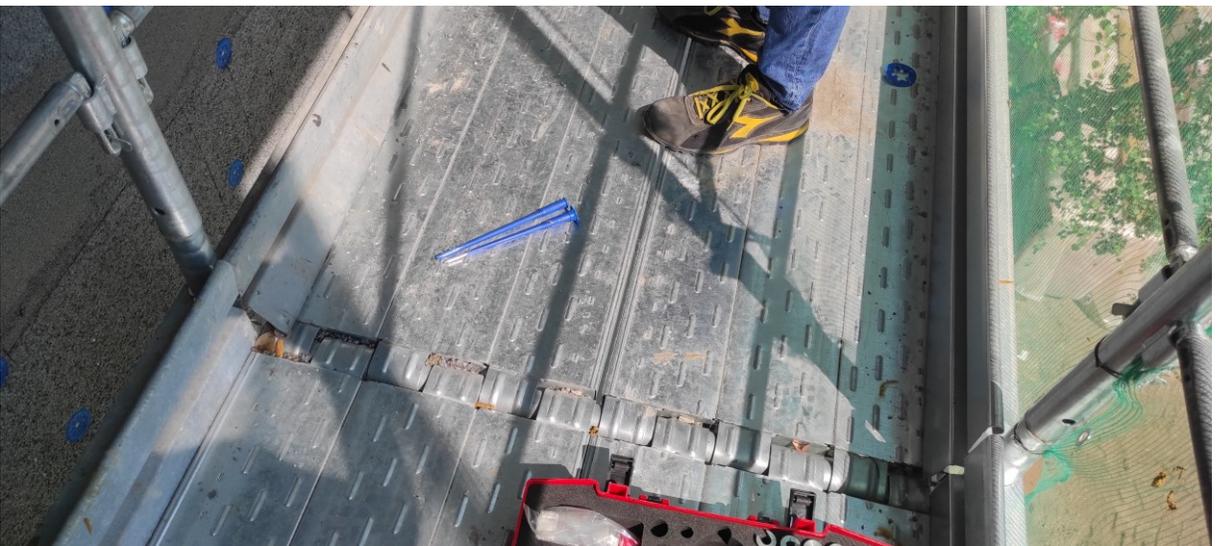



2. In cantiere sono presenti n. 3 operai che effettuano la demolizione del balcone al settimo piano lato ovest (proprietà Negri)
3. Nei prossimi giorni si proseguirà con le demolizioni balconi e posa del cappotto
4. **La DL dispone che i pannelli isolanti devono essere posati sulle superfici utilizzando la colla, non la schiuma poliuretana e seguendo le disposizioni del manuale Cortexa**
5. In riferimento al punto 3 del verbale del 20 luglio, la DL concorda con l'impresa e lo Studio Rollino la soluzione rappresentata da schema sotto riportato:

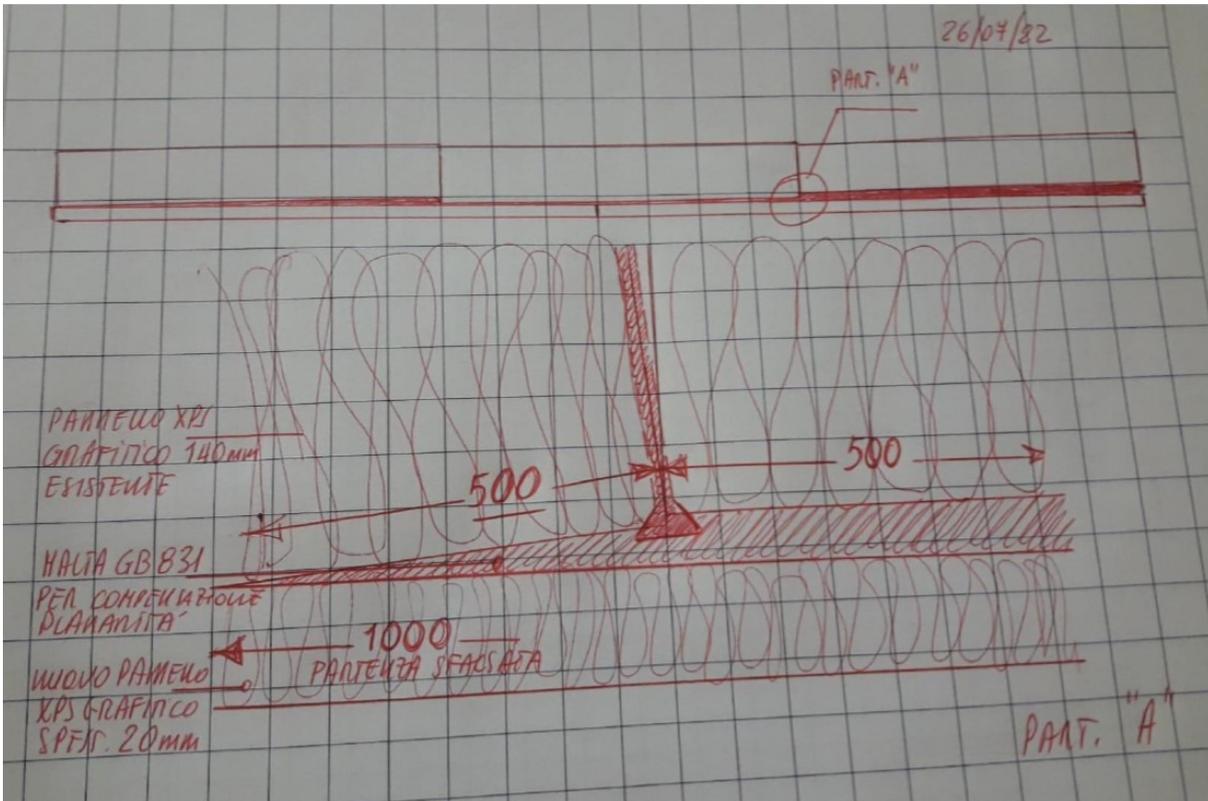

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

