

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 03 agosto 2022

VERBALE DI CANTIERE


Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 03 agosto 2022 dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: collaboratore Ing. Rustico arch. Temporin, ing. Andrea Lombardo (General Contractor Engie Servizi S.p.A), ing. Mulas (Studio Rollino), Amm. Filippo Meucci.

Si verbalizza quanto segue:

- L'Ing. Andrea Lombardo ha comunicato che per quanto riguarda i davanzali di finestre private e vani scala è stata confermata la Pietra di Vals Grey.

Lo stesso ha chiesto all'Ing. Rustico di redare uno schema per il posizionamento degli stessi, ovvero dimensione del gocciolatoio, se i davanzali devono sporgere lateralmente rispetto l'apertura della finestra ecc.

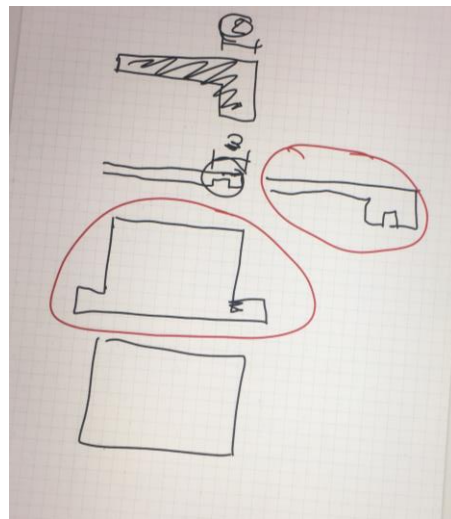

L'ing. Rustico fa presente che quanto richiesto risulta essere un dettaglio costruttivo architettonico e quindi si rimanda la scelta e comunicazione dei dettagli allo Studio Rollino.

- Durante il sopralluogo erano presenti 5 operai che stavano provvedendo alla posa dell'isolamento sui plafoni dei balconi;
- Per quanto riguarda il campione di prova per la modifica da eseguire sul parapetto del balcone si chiede all'impresa di comunicarci la data in cui sarà eseguita tale lavorazione al fine di poter verificare ed eventualmente approvare quanto realizzato;
- Si comunica a tutti i condomini che le lavorazioni continueranno tutto il mese di agosto senza sospensioni;
- Dal sopralluogo effettuato in cantiere si è riscontrato che in più punti l'impresa aveva rimosso i parapetti interni del ponteggio e è stato riscontrato che una botola di accesso era stata lasciata aperta e la scala era stata rimossa.

Come comunicato al preposto di cantiere si chiede l'immediata verifica di tutto il ponteggio e la messa in sicurezza dello stesso. Si ricorda inoltre che è assolutamente vietata la rimozione o manomissione degli elementi del ponteggio.

Si ricorda a tutti che in cantiere è sempre obbligatorio l'utilizzo di idonei DPI in particolare del casco. Si comunica che chi non osserverà queste prescrizioni sarà allontanato dal cantiere.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

4

- Si comunica che come accordi presi in cantiere la prossima riunione si terrà il 24/08/22.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

