

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Marco Caprari  
Dott. Sebastiano Castorina  
Dott. Andrea Lombardo

[marco.caprari@engie.com](mailto:marco.caprari@engie.com)  
[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)  
[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**IMPRESA ESECUTRICE**

**RECOVER ITALIA SRL**  
Dott. Ing Ferlenghi  
Geom Lombardo

[lombardo@recoveritalia.it](mailto:lombardo@recoveritalia.it)  
[ferlenghi@recoveritalia.it](mailto:ferlenghi@recoveritalia.it)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
Dott Mulas  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)  
[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 25 agosto 2022

## VERBALE DI CANTIERE


### **Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

La presente per comunicare che in data 25 agosto 2022 dalle ore 9.00 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: ing. Rustico, arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice Ing. Rustico), ing. Antonello Mastropiero (General Contractor Engie Servizi S.p.A), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover).


Si verbalizza quanto segue:

- In cantiere sono presenti n. 9 operai, dei quali solo 2 sono in possesso del tesserino di riconoscimento. Si ricorda che tutti gli operai devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento
- Completata posa di strato isolante balconi
- Completata posa cappotto su sfondati balconi
- L'impresa comunica l'impossibilità nell'immediato di eseguire nuovamente le prove di estrazione dei tasselli con idoneo strumento. La DL, al fine di non interrompere le lavorazioni, procederà il giorno 1 settembre ad effettuare delle prove di estrazione dei tasselli a campione in modo da verificarne la stabilità. Se la prova darà esito positivo si procederà con la rasatura. L'impresa comunica di aver già provveduto a verificare la stabilità dei tasselli e sostituirne alcuni risultati poco stabili

- Si chiede allo Studio Rollino di dare riscontro dei calcoli dei ponti termici a seguito di posa del copriferro su balconi (rif. verbale del 23/08/2022)
- Si chiede all'impresa Engie di confermare o comunicare eventuali modifiche del cronoprogramma di tutti e tre gli immobili oggetto di intervento entro il giorno 1 settembre, in quanto in sede di riunione si discuterà delle tempistiche delle lavorazioni

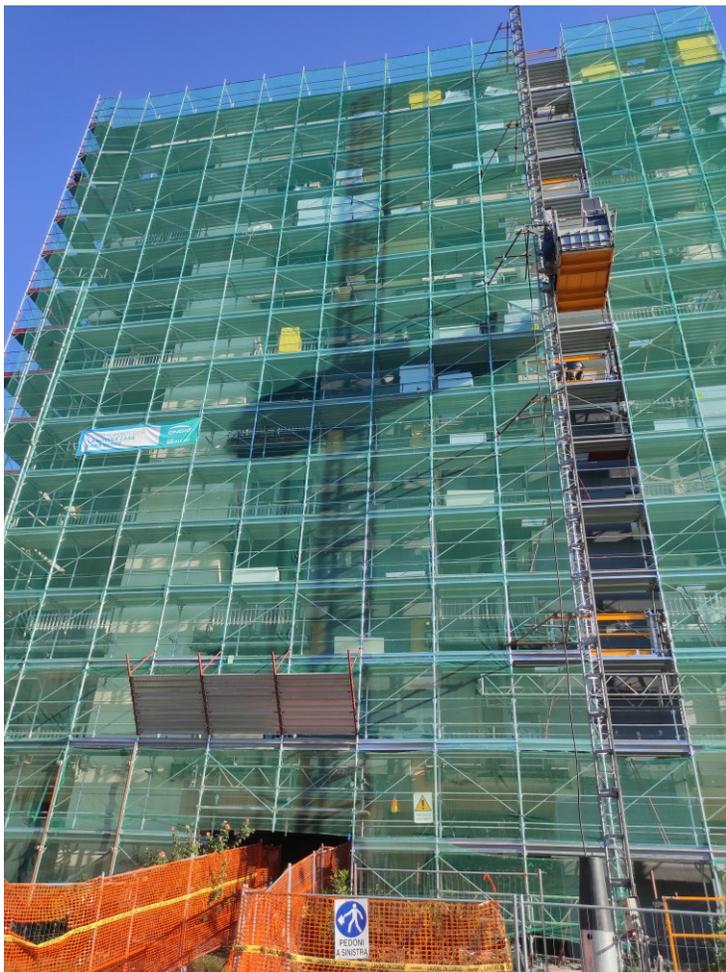

- APPLICAZIONE COLLANTE SU PANNELLI: Viene utilizzato il metodo a tutta superficie, conforme alle prescrizioni del manuale di posa Cortexa

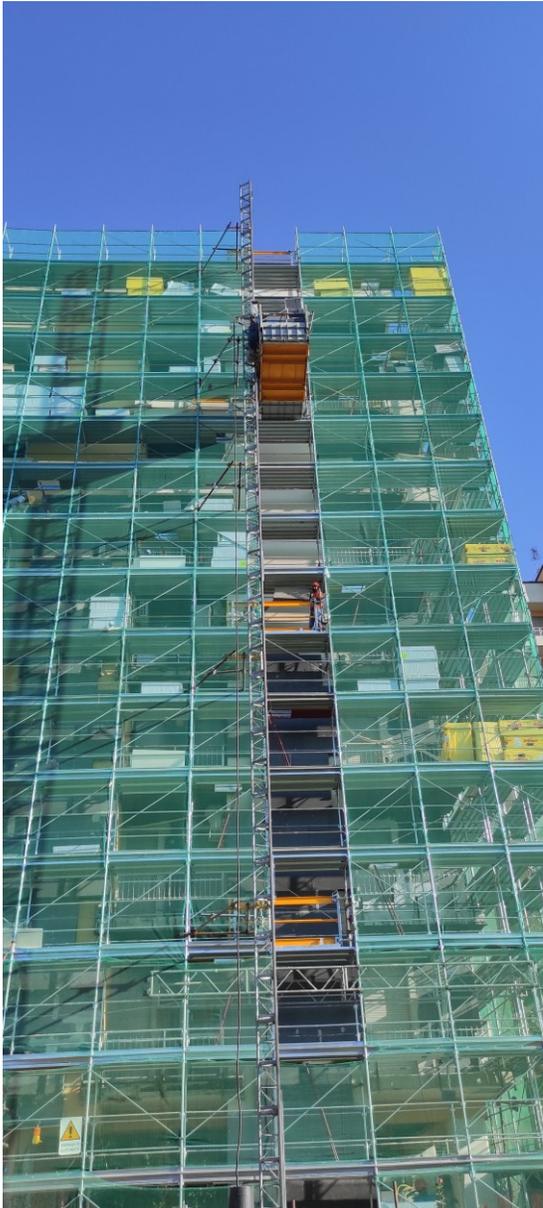

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

