

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Marco Caprari  
Dott. Sebastiano Castorina  
Dott. Andrea Lombardo

[marco.caprari@engie.com](mailto:marco.caprari@engie.com)  
[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)  
[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**IMPRESA ESECUTRICE**

**RECOVER ITALIA SRL**  
Dott. Ing Ferlenghi  
Geom Lombardo

[lombardo@recoveritalia.it](mailto:lombardo@recoveritalia.it)  
[ferlenghi@recoveritalia.it](mailto:ferlenghi@recoveritalia.it)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
Dott Mulas  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)  
[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 16 febbraio 2022

## VERBALE DI CANTIERE

### **Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

La presente per comunicare che in data 16 febbraio dalle ore 11.00 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: avv. Filippo Meucci (amministratore), arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), studio Rollino.

Si verbalizza quanto segue:


- È stata allestita l'area di cantiere ove previsto; sono stati posizionati i servizi chimici e la baracca, le aree di cantiere sono state delimitate con recinzione metallica e rete arancione
- L'impresa Engie deposita il POS presso la baracca di cantiere; è presente la documentazione delle imprese Engie e Recover, manca il progetto del ponteggio e l'impresa Recover provvederà a depositarne una copia cartacea i prima possibile. E' presente il cartello di cantiere non ancora compilato, la DL chiede che venga compilato ed affisso all'entrata del complesso. Manca anche la notifica preliminare, si sollecita lo Studio Rollino ad inviarne una copia all'impresa. La notifica dovrà essere stampata ed esposta in corrispondenza dell'entrata al complesso, in quanto l'area di cantiere si trova in zona privata



- E' stato posizionato il quadro elettrico di cantiere e posati i cavi elettrici interrati



- L'impresa Recover ha procurato i campioni per le piastrelle balconi. I presenti hanno scelto n.4 tipi di campioni piastrelle che verranno sottoposti ai condomini per la scelta. L'amministratore si incarica di provvedere a preparare gli avvisi per i condomini e gli elenchi per le scelte colori e formato. Le piastrelle proposte sono della ditta Tuscania Ceramiche serie Vals, classe R11. La scelta è tra i campioni numerati 1 – 2 – 3 – 4; i formati proposti sono 30 x 60, come da capitolato e 20 x 40, consigliato dall'impresa in quanto più adatto alla formazione delle pendenze sui balconi

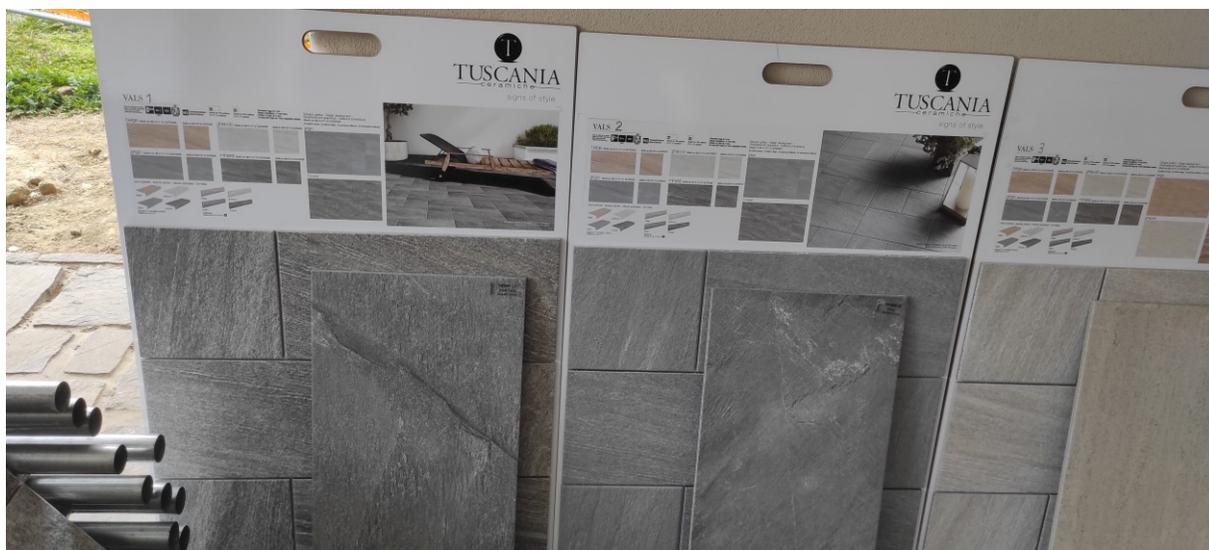

- Alle ore 11 sono presenti 2 progettisti dello studio che si occupa della progettazione ponteggio per un sopralluogo
- Si prevede che il mezzo per l'insufflaggio dovrà essere posizionato vicino all'area di cantiere; l'amministratore avviserà i condomini 10 giorni prima del posizionamento del mezzo.
- L'impresa Engie chiede di verificare le modalità di accesso in copertura

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

