

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 21 dicembre 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 21 dicembre 2022 alle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice Ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo, (General contractor Engie), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Giovanni Fusarelli (studio Rollino)

CIVICI 33 E 37/39 - FALDUTO

Si verbalizza quanto segue:

- Sono presenti n. 5 operai al civico 33 e n. 2 operai al civico 37/39
- Sono cominciate le operazioni di insufflaggio al civico 37/39



Al civico 33 gli operai stanno montando gli avvicinamenti del ponteggio per effettuare le lavorazioni sui balconi.

È stato eseguito un campione della struttura fioriera; in seguito, il campione procederà con le altre parti.



È stato eseguito il taglio dei traversi della struttura e raccordo con allungamento di 5 cm.


La struttura originaria presenta dei ferri con probabile funzione di stabilizzazione della fioriera; questi ferri verranno sostituiti con degli elementi in acciaio inossidabile e piedini in gomma per appoggio su piastrelle.



L'impresa propone un'armatura integrativa del copriferro, invierà schede tecniche dei materiali per approvazione di DL e progettista.

A seguito dell'allungamento della struttura (circa 5 cm), la fioriera (la cui larghezza non sarà modificata) verrà collocata su filo esterno, mentre, su filo interno verso balcone, verrà collocato un elemento tubolare metallico a sezione quadrata per stabilizzare la fioriera. Questo elemento sarà verniciato dello stesso colore delle ringhiere.

Sono stati visionati i campioni colore dei davanzali alla presenza dell'amministratore Filippo Meucci. È stato scelto il colore "beige", indicato in foto in quanto risulta più simile al colore esistente.

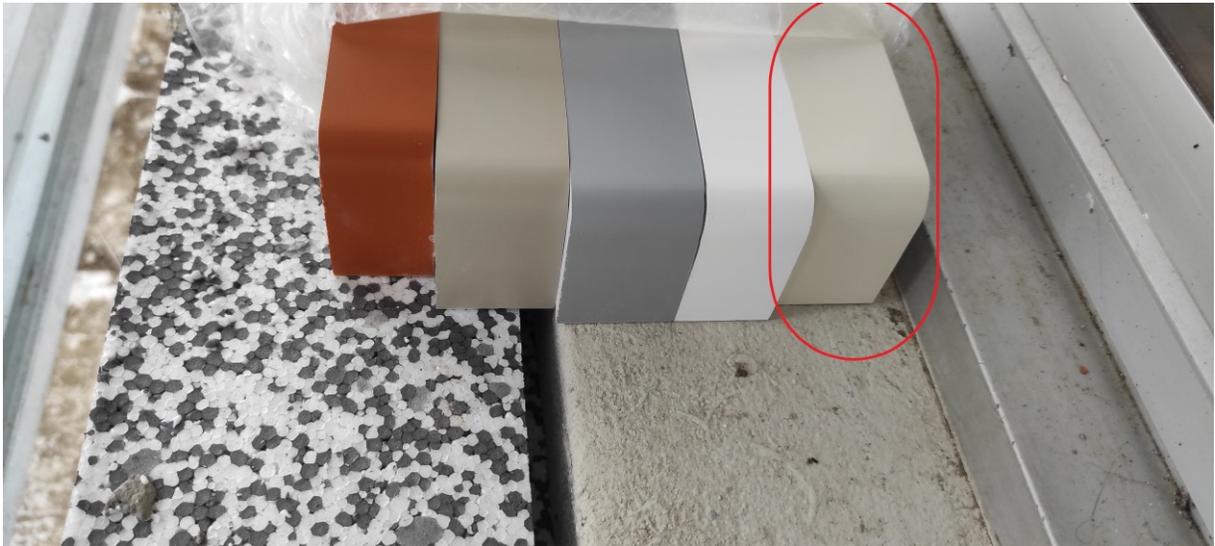

Si procede con la tassellatura al civico 33: eseguito su tutto lato nord e il primo piano su altri lati.



SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com





La DL approva la posa dei tasselli.

CIVICO 35 – RECOVER

Presenti n. 5 operai di Recover, gli operai di Boaglio sono assenti in quanto stanno frequentando un corso di aggiornamento.

Presente l'elettricista che sta effettuando collegamenti di alcuni condizionatori e giunti sugli impianti di allarme.

Procede la rasatura all'interno dei balconi. Manca la seconda mano di rasatura su n. 23 balconi.

È stata stesa la resina su n. 57 balconi.

Posate le piastrelle su n. 29 balconi e lo zoccolino su n. 22 balconi.






Posati tutti i pannelli aquapanel laterali.

Posate tutte le scossaline in corrispondenza delle solette balconi.

Si segnala nuovamente che alcune scossaline non aderiscono bene alla soletta in alcuni punti. L'impresa effettuerà ulteriore tassellatura prima di effettuare la seconda mano di resina.

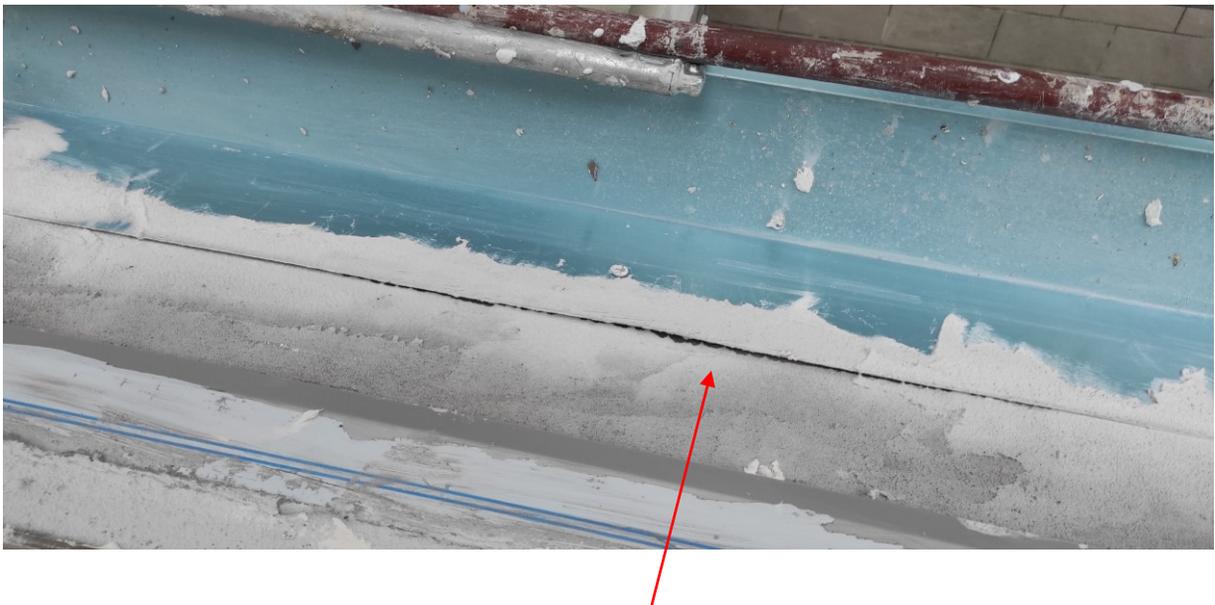

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

