

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott.Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 11 gennaio 2023


VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 11 gennaio 2023 alle ore 11.00 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: ing. Rustico e arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), arch. Giovanni Fusarelli ed Enrico Gandino (Studio Rollino), amministratore avv. Filippo Meucci.

CIVICO 33 E 37/39 – IMPRESA FALDUTO

- Sono presenti n.5 operai al civico 33 e n.5 al civico 37/39. Prosegue la posa tasselli.
- A fine gennaio si prevede di iniziare a gettare i massetti sui balconi di entrambi gli immobili
- A febbraio è prevista la posa della rimanente porzione a L del ponteggio al civico 37/39. Si chiede all'amministratore di avvisare i condomini e di far rimuovere eventuali opere provvisionali/ argani di altri cantieri in modo da non creare interferenze.
- Da domani è previsto l'intervento del fabbro per la rimozione delle strutture delle fioriere
- L'impresa ha predisposto i campioni colori. La DL e amministratore approvano.
- Si sollecita a Studio Rollino l'aggiornamento della notifica preliminare

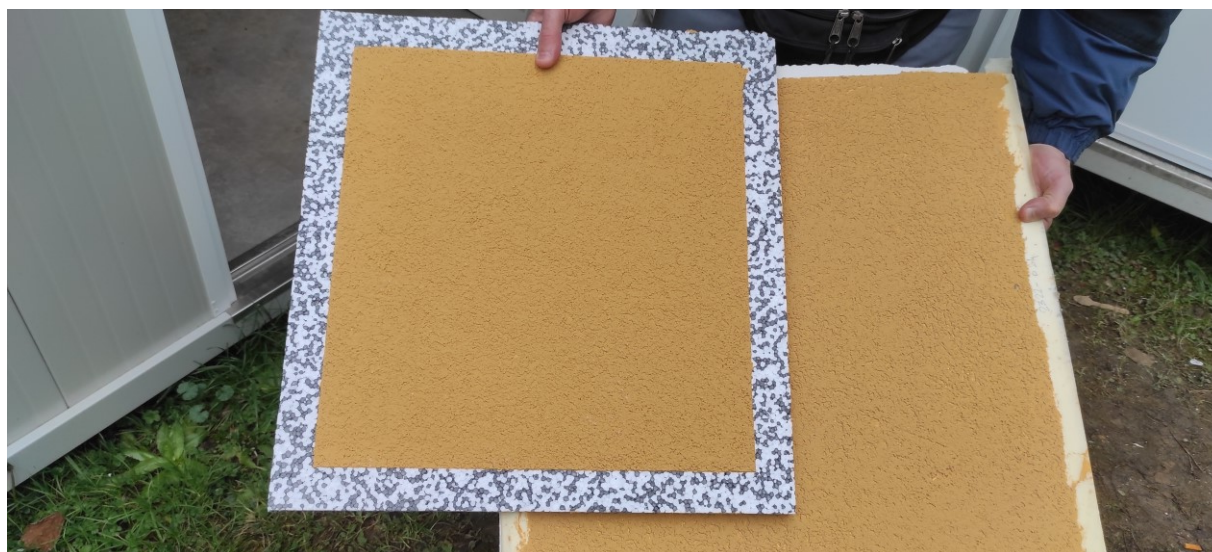

CIVICO 35 – RECOVER

Sono presenti 14 operai; è stato steso il fondo per la tinteggiatura ai piani 7 e 8. È stata stesa la pasta ai silicati sui plafoni dei balconi ai piani 7 e 8.

Sono terminati n. 73 balconi, compresa la stuccatura e posa zoccolino, su n. 58 balconi è stato posato lo zoccolino ed è stata effettuata la stuccatura su n. 54 balconi.

È cominciato il montaggio della struttura delle fioriere per la posa dell'aquapanel.

È stato rimosso il cassone delle macerie.

L'impresa ha segnalato che è stato accidentalmente danneggiato un pozzetto durante il passaggio del mezzo e che si è già attivata per il ripristino. Il pozzetto è stato recintato e segnalato.

Da venerdì 13 a domenica 15 lo Studio Rollino poserà dei fonometri in copertura per misurare il rumore ambientale ai fini di valutare l'impatto acustico delle macchine impiantistiche da collocare in copertura.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

5



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

