

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott.Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 12 luglio 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.35 Noverasco - Opera (MI)

In data 12 luglio 2023 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico) ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), geom. Valerio (impresa Falduto).

Si effettua sopralluogo al civico 37/39 al fine di verificare le lavorazioni e consentire lo smontaggio del ponteggio lati nord e ovest.

Entro la giornata odierna verrà terminata la pulizia generale.

Si segnalano alcuni ritocchi, sbavature, finiture puntuali; da sigillare alcune giunture tra le due fioriere in corrispondenza degli angoli, è già stato attivato il lattoniere che interverrà nel pomeriggio.







Previa sistemazione di quanto sopra, si autorizza lo smontaggio del ponteggio lati nord e ovest da domani 13 luglio.


È terminata anche la posa dei pannelli del controsoffitto piano terra.

Come da mail inviata dall'impresa Falduto all'amministratore in data 08/07 si segnala che sono stati danneggiati circa una decina di pannelli del controsoffitto da un'impresa che sta eseguendo lavori privati. L'amministratore ha provveduto a contattare l'impresa per il ripristino.

Plafone civici 33 e 35: l'impresa sta posando ulteriori fissaggi in quanto la zona è molto soggetta all'azione del vento.

CIVICO 35: come da segnalazione ricevuta a mezzo mail dall'amministratore in data 06/07, a causa del forte vento si è staccata una scossalina in corrispondenza dell'inizio cappotto su parapetto in copertura. Come richiesto dalla DL, Engie ha provveduto, in data 07/07, a ripristinare e tassellare la scossalina staccata e a fissare con tasselli le altre scossaline nella stessa posizione.

È stato necessario tagliare una parte danneggiata della lattoneria; verrà ripristinata appena possibile

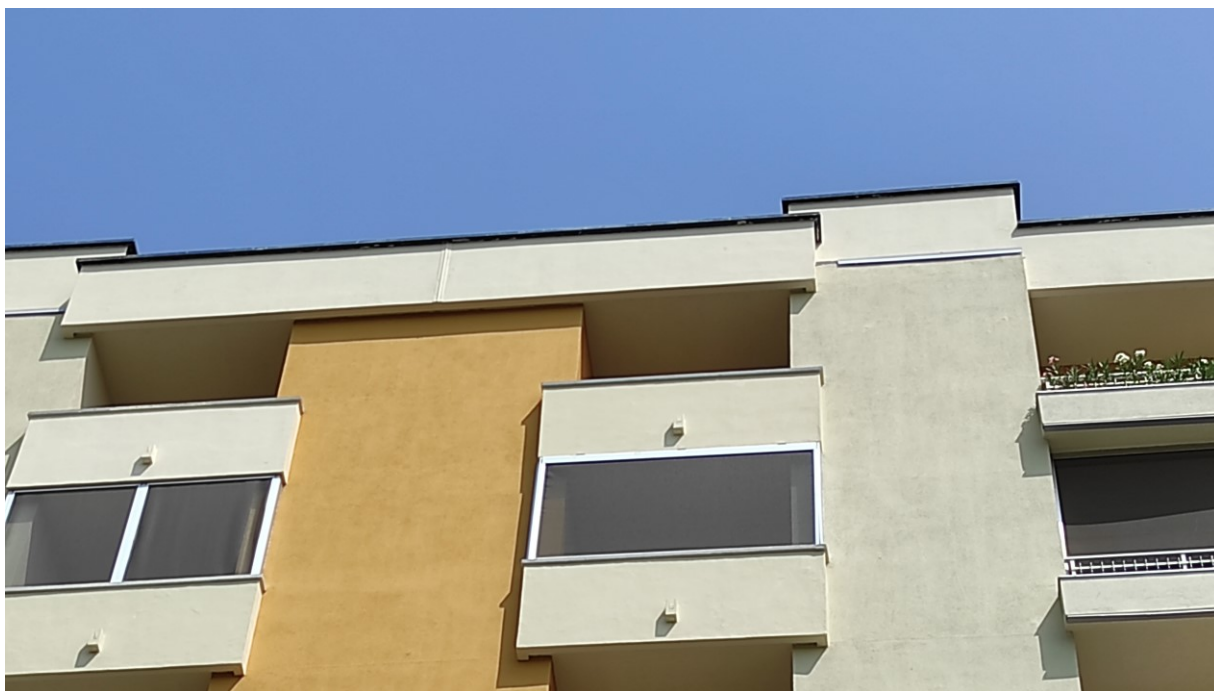

Le finiture al civico 35 non sono ancora terminate;

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

7

TEMPISTICHE: si prevede l'installazione di tutte le componenti impiantistiche entro metà agosto; da settembre saranno effettuati i collaudi.

La posa dei serramenti dei vani scala è prevista dalla metà di settembre.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

