

**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 16 marzo 2022

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

2

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)



La presente per comunicare che in data 16 marzo dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: avv. Filippo Meucci, (amministratore), arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), Studio Rollino

Si verbalizza quanto segue:

- Prosegue il montaggio del ponteggio su tutti i lati del civico 35 e i relativi impianti (allarme, illuminazione)



**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

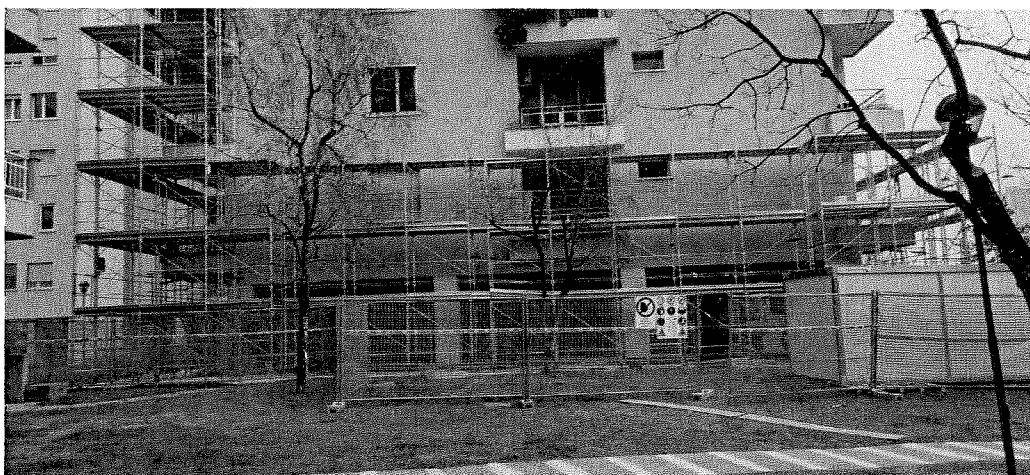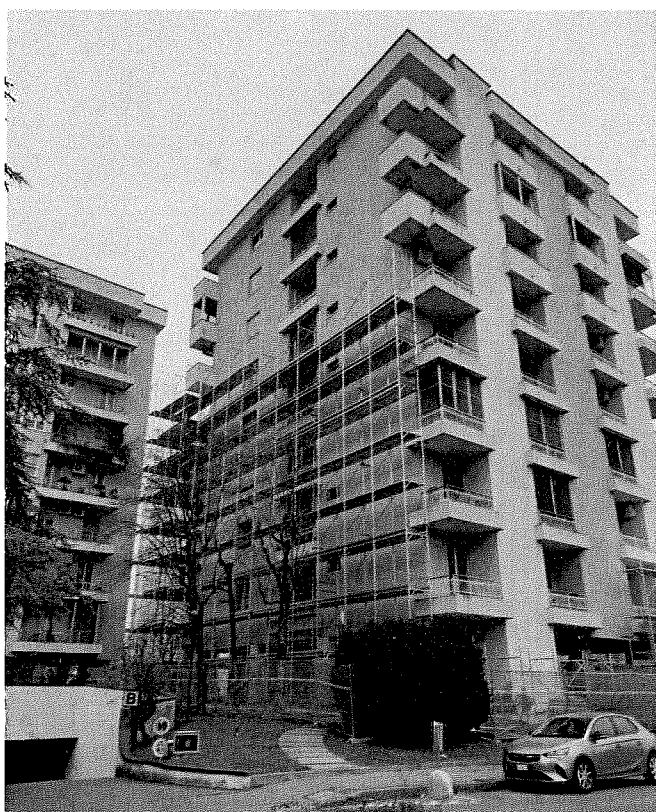

**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

4




- Sono stati eseguiti altri saggi all'interno di due unità immobiliari
- Entro domani 17/03/2022 è previsto l'arrivo del cassone macerie da collocarsi dove previsto
- È cominciata la demolizione del plafone del porticato in corrispondenza dell'area di cantiere. Nei prossimi giorni è prevista la demolizione del plafone in corrispondenza del passaggio dei condomini. La demolizione verrà effettuata in due fasi per lasciare libero un passaggio ai condomini e sarà presente un moviere.

**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

5

Da lunedì 21 marzo è prevista la demolizione plafone in zona deposito biciclette condominiali. L'amministratore avviserà i condomini di liberare l'area dalle biciclette. Le stesse potranno essere depositate sotto il porticato e ancorate a un pannello metallico messo a disposizione dall'impresa

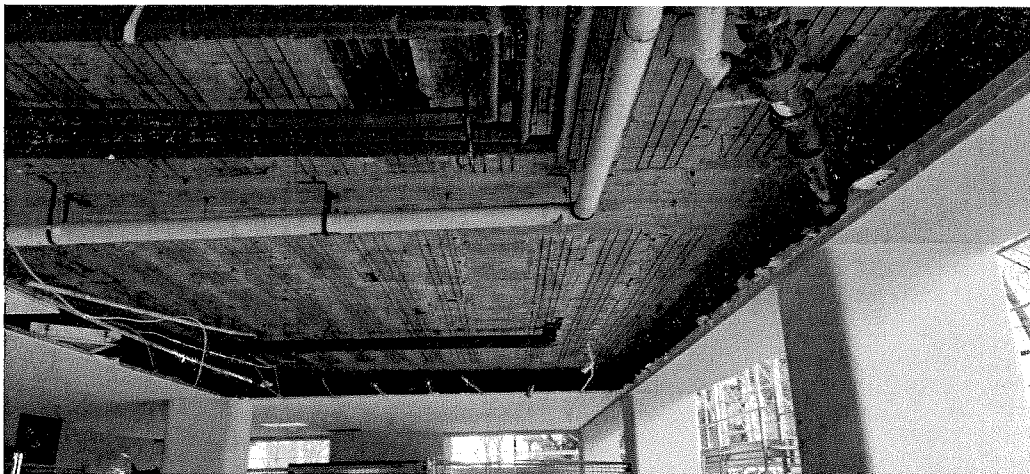

**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

6

- L'amministratore sta raccogliendo le preferenze dei condomini per il tipo di piastrelle dei balconi. Il termine per la scelta è venerdì 18/03/2022
- Il cartello di cantiere e la notifica preliminare sono stati affissi al cancello di ingresso al complesso



- Si ricorda all'impresa che ogni operaio deve essere in possesso del tesserino

**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

7

- Si riporta stralcio del verbale del 28/02/2022:
 - TEMPISTICHE: Entro venerdì 4 marzo il General Contractor Engie fornirà allo Studio Rollino le schede tecniche dei materiali proposti. Entro il 15 marzo lo Studio Rollino verificherà la fattibilità delle soluzioni proposte da Engie. Il ponteggio sarà montato in quattro settimane. A seguito di verifica dei nuovi materiali da utilizzare, entro il 15 marzo Engie fornirà un nuovo cronoprogramma. Si prevede la modifica delle tempistiche di lavorazione parziali, sovrapponendo temporalmente le lavorazioni del civico 35 e del civico 33; rimane invariato il termine di fine lavori previsto per ottobre 2022

La DL segnala che ad oggi la verifica dei nuovi materiali risulta in corso e non è stato fornito il nuovo cronoprogramma. La DL chiede a Engie di fornire il nuovo cronoprogramma prima possibile al fine di evitare ritardi nelle lavorazioni.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico





dealab

analisi chimiche - sicurezza sul lavoro - ambiente - acustica ambientale

DEALAB S.R.L.
via Pregnana n°8 - 20017 Rho (MI)
tel. 02.930.97.70 fax 02.935.044.25
mail dealab2001@libero.it
P.IVA / C.F. 04158400962



CERTIFICATO ANALITICO

Spettabile: RECOVER ITALIA SRL
via TRENTO 34 20024 GARBAGNATE M.SE (MI)

Riferimento Campione: GESSO - OPERA VIA SPORTING MIRASOLE

Prelevato il 14/02/22

DATA 11/03/22

Certificato n°
1009/22

Consegnato il 17/02/22

Prelevato da CLIENTE

DETERMINAZIONE DELLE FIBRE MINERALI

ANALISI CHIMICA:

PARAMETRI:	Risultati
di diametro medio ponderato rispetto alla lunghezza delle fibre (ai sensi delle linee guida della Regione Lombardia del 22.12.2010, DM 08/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All. 1B + Reg CE 761/2009 23/07/2009 GU CE L220/1 24/08/2009 All II, Allegato VI del Regolamento CE 1272/2008)	7,5 µm
Contenuto di ossidi alcalino e alcalino terrosi:	
Ossido di Sodio (Na ₂ O)	0,17 %
Ossido di Potassio (K ₂ O)	<0,1 %
Ossido di Calcio (CaO)	16,74 %
Ossido di Magnesio (MgO)	8,0 %
Ossido di Bario (BaO)	<0,1 %
Tenore di ossidi Totale	24,91 %
	(LANA MINERALE)

Analisi per caratterizzazione di materiali contenenti o costituiti da fibre artificiali vetrose (materiali da costruzione, materiali da demolizione, materiali coibenti, manufatti, pannelli) con riferimento al Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, All. VI Parte 1 Nota R (La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6µm) e Parte 3 Tab.3.1 (Fibre ceramiche refrattarie: fibre vitree (silicato) artificiali con orientamento casuale con contenuto inferiore o uguale al 18% in peso di ossidi alcalini e ossidi alcalino terrosi)

Pertanto, visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti in base alla campionatura ricevuta dalla ditta, si può affermare, tenuto conto delle concentrazioni limite definite dal DPR 915, Conferenza permanente rapporti stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, che il campione in esame, se considerato come rifiuto, risulta essere:

RIFIUTO NON PERICOLOSO, ai sensi degli allegati A,B,C,D,E,F,G,H della parte IV del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n.152 e successive modifiche(REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 18/12/2014

e viene classificato con CER 17.08.02

CLASSI DI PERICOLOSITA' :


-

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..
In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilit  alcuna circa la rispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intero lotto o partita da cui lo stesso   stato prelevato. I risultati si riferiscono al campione cos  come ricevuto. Il laboratorio non   responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza, Data Prelievo e Dati di Campionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente.

La preparazione del campione, viene effettuata seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 paragrafo 5.1.A del Decreto Ministero Sanit  del 6/9/94 Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n  220

L'analista Dr. *Osvaldo Licciardi*



Laboratorio inserito nel programma di qualificazione da parte del Ministero della Sanit  previsto dall'Allegato V del D.M. del 14 Maggio 1996 relativo ad analisi sull'ambiente con tecniche MOCF e FTIR.
