Diagramma di GANTT
Dal 1/01/22 al 22/09/22
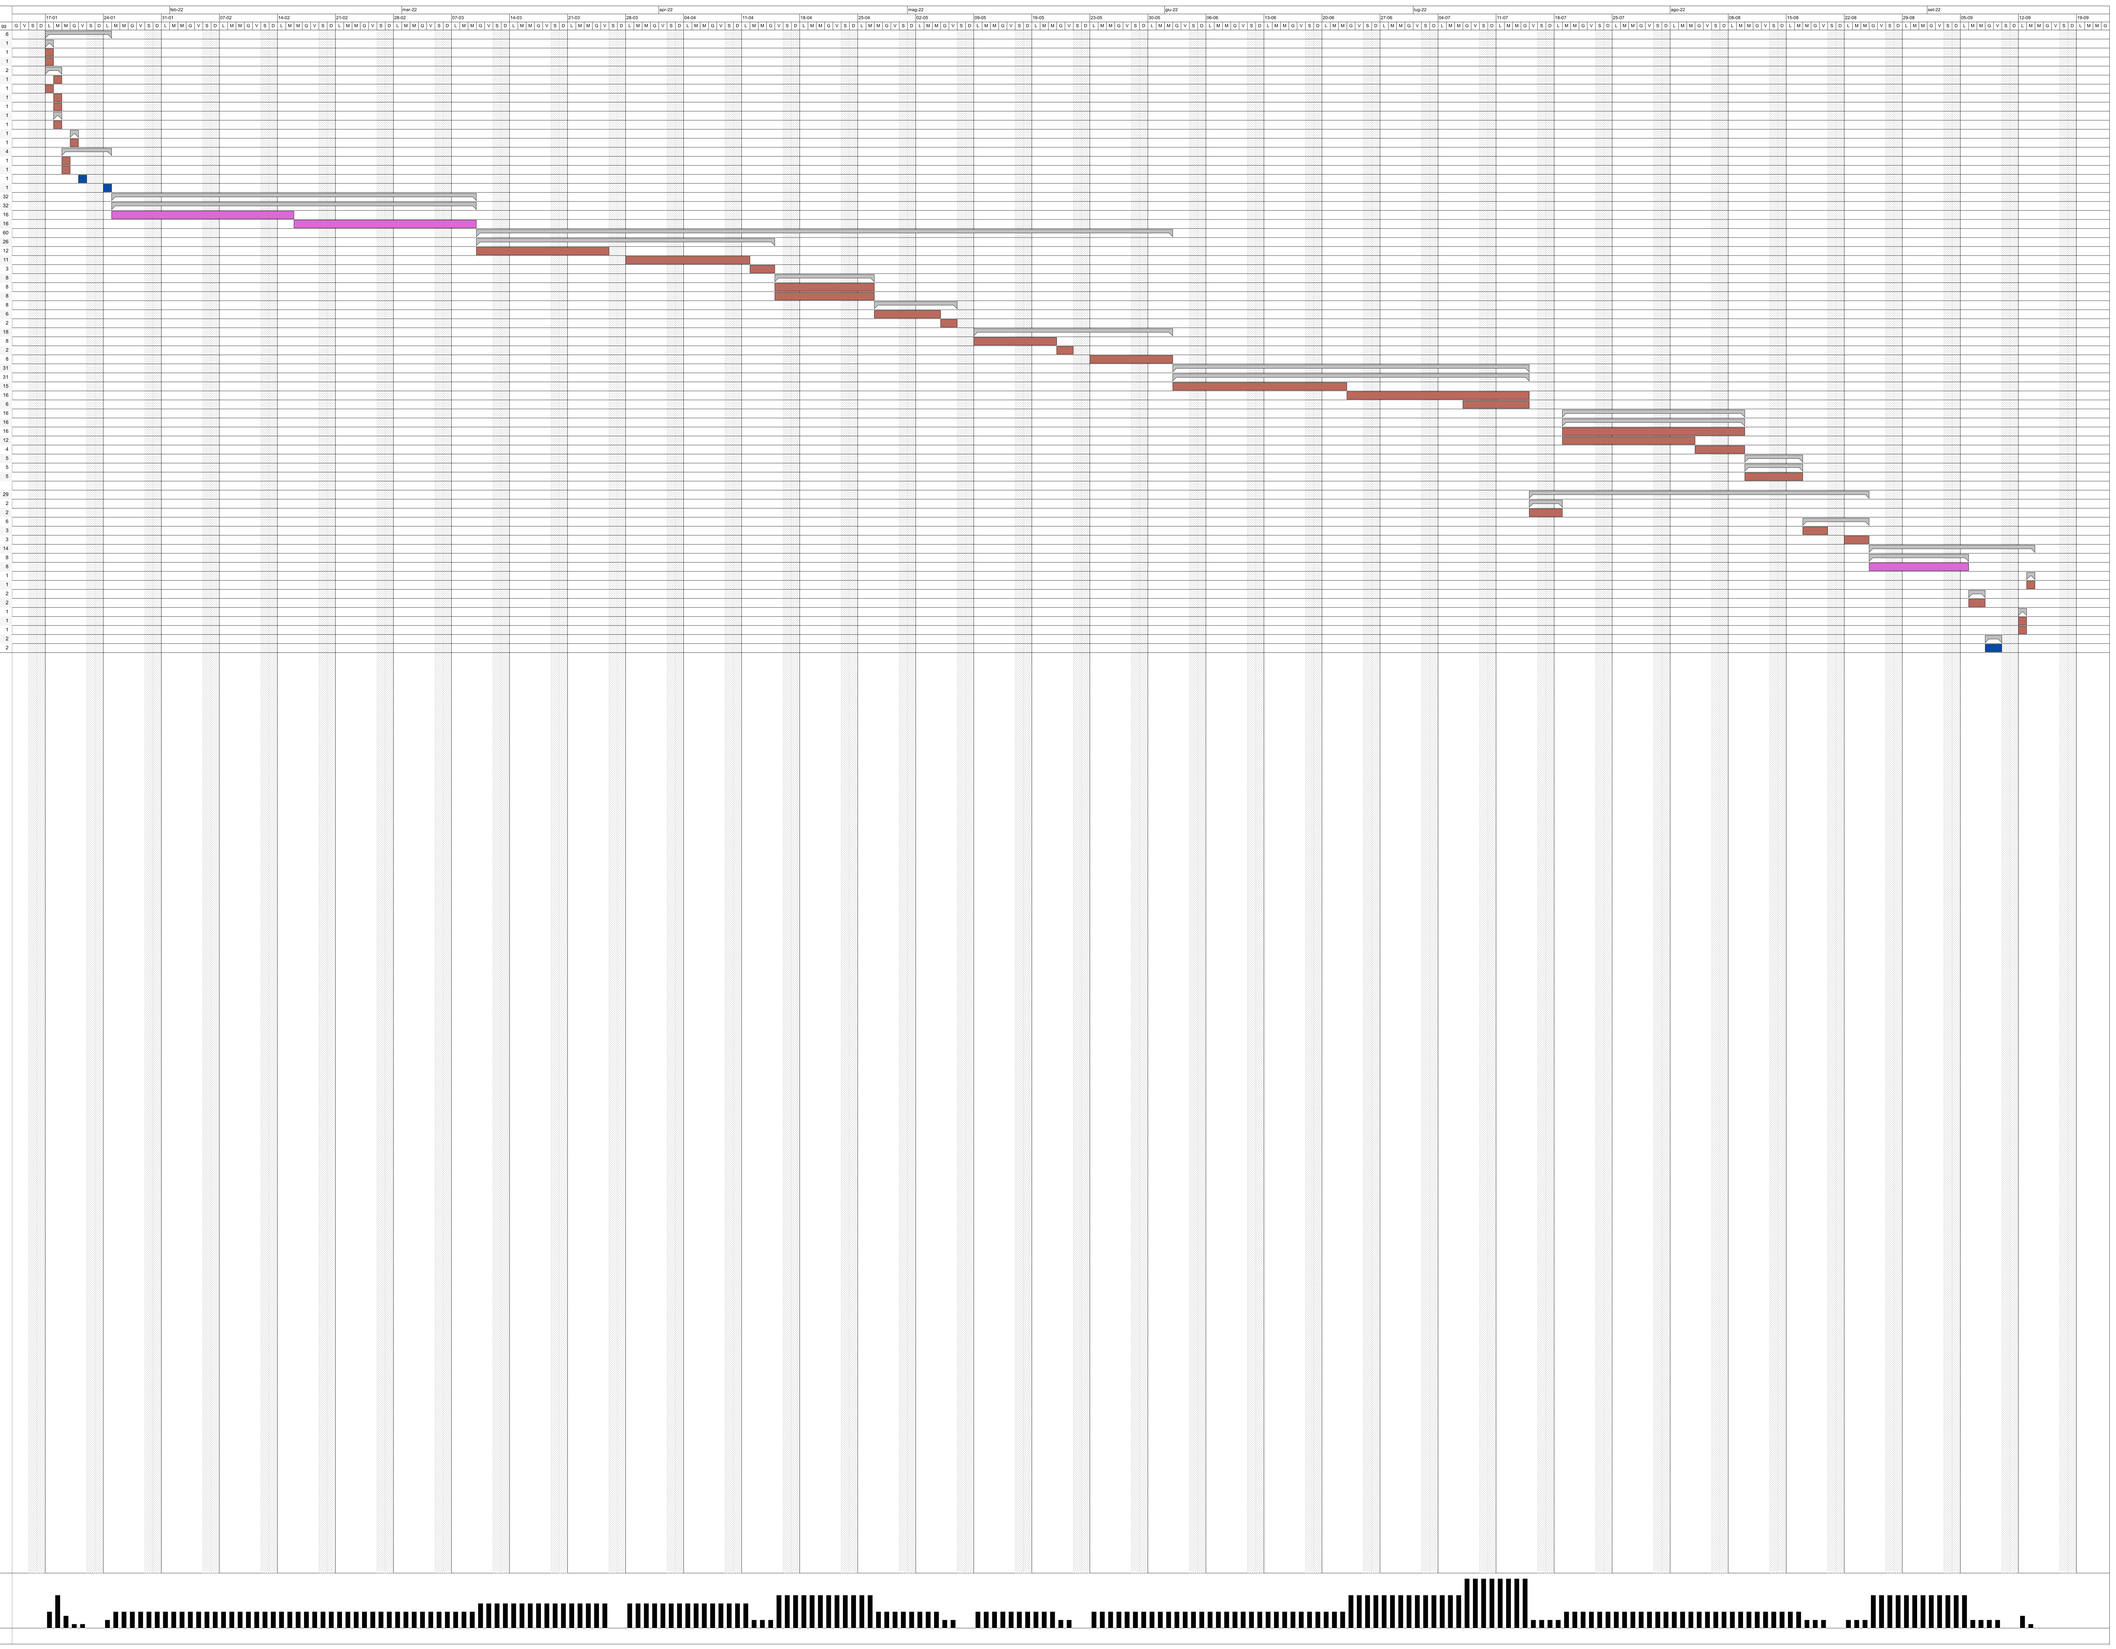
Attività	Start	gg
Allestimento del cantiere	lun 17/01	6
Recinzione con pali di legno o londini di ferro...	lun 17/01	1
Infissione dei pali di sostegno	lun 17/01	1
Fissaggio della rete	lun 17/01	1
Delimitazione e sistemazione dell'area di can...	lun 17/01	2
Carico e scarico dei materiali dagli automezzi	mar 18/01	1
Predisposizione di tabellone informativo dei...	lun 17/01	1
Realizzazione di servizi igienici	mar 18/01	1
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i lo...	mar 18/01	1
Predisposne aree e strutture per lo stoccaggio...	mar 18/01	1
Realizzazione di depositi per i materiali	mar 18/01	1
Delimitazione di zone pericolose	gio 20/01	1
Infissione di paletti e posa della rete	gio 20/01	1
Impianto di terra del cantiere edile	mer 19/01	4
Scavo a mano per realizzazione dei pozzetti	mer 19/01	1
Installazione dei pozzetti e delle puntazze	mer 19/01	1
Allacciamento della rete all'impianto di terra	ven 21/01	1
Collaudo dell'impianto di terra	lun 24/01	1
Opere provvisionali	mar 25/01	32
Montaggio degli elevatori	mar 25/01	32
Montaggio degli elevatori	mar 25/01	16
installazione ponteggio	mar 16/02	16
lavori in facciata di rimozione	gio 10/03	60
Pulitura, spiccionatura e rinocciatura	gio 10/03	26
Pulitura di superfici intonacate facciata	gio 10/03	12
Rinocciatura delle parti da coibentare	lun 28/03	11
Trasporto a discarica	mar 12/04	3
revisione tende da sole e zanzariere	ven 15/04	8
smontaggio e rimontaggio tende da sole e z...	ven 15/04	8
rimozione di apparecchi elettrici, di illuminaz...	ven 15/04	8
Opere da fabbro	mer 27/04	8
smontaggio,taglio e delle ringhiere	mer 27/04	6
trasporto a discarica	gio 05/05	2
smontaggio serramenti	lun 09/05	18
smontaggio serramenti	lun 09/05	8
trasporto a discarica	gio 19/05	2
rimontaggio serramenti	lun 23/05	8
Coibentazione e impermeabilizzazione	gio 02/06	31
Opere di isolamento e impermeabilizzazione	gio 02/06	31
Applicazione isolante con macchina spruzza...	gio 02/06	15
Applicazione pannelli isolanti	gio 23/06	16
Isolamento intradosso di solaio primo piano	gio 07/07	6
Finiture	mar 19/07	16
Intonaci	mar 19/07	16
Preparazione dell'intonaco in cantiere	mar 19/07	16
Applicazione di intonaco rustico con impast...	mar 19/07	12
Applicazione intonaco di calce a mano	gio 04/08	4
Rimontaggio	mer 10/08	5
Rimontaggio ringhiere	mer 10/08	5
tiro in alto e rimontaggio ringhiere a cappotto	mer 10/08	5
Nuova voce d'opera		
Impianti	ven 15/07	29
Impianti termici	ven 15/07	2
Posa in opera di pompe di calore	ven 15/07	2
Impianti a fonti rinnovabili	mar 17/08	6
Montaggio degli elementi di supporto dei pa...	mer 17/08	3
Impianto solare fotovoltaico	lun 22/08	3
Smobilitazione del cantiere	gio 25/08	14
Smontaggio ponteggio	gio 25/08	8
Smontaggio ponteggio	gio 25/08	8
Smontaggio recinzione	mar 13/09	1
Rimozione della recinzione	mar 13/09	1
Smontaggio montacarichi	mar 06/09	2
Smontaggio montacarichi	mar 06/09	2
Rimozione di box prefabbricati	lun 12/09	1
Eliminazione fissaggi	lun 12/09	1
Carico su autocarro	lun 12/09	1
Rimozione dell'impianto elettrico	gio 08/09	2
Rimozione dei quadri e delle linee	gio 08/09	2
